


Gestao de Mudanca de Spec — SDD

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

Princípio: Uma mudanca de spec em desenvolvimento nao e um problema — e informacao nova. O problema e nao ter um processo claro para decide-la rapidamente. Este documento define o fluxo completo: da solicitacao ao registro da decisao.

1. FLUXO DE DECISAO — MUDANCA DE SPEC EM DESENVOLVIMENTO

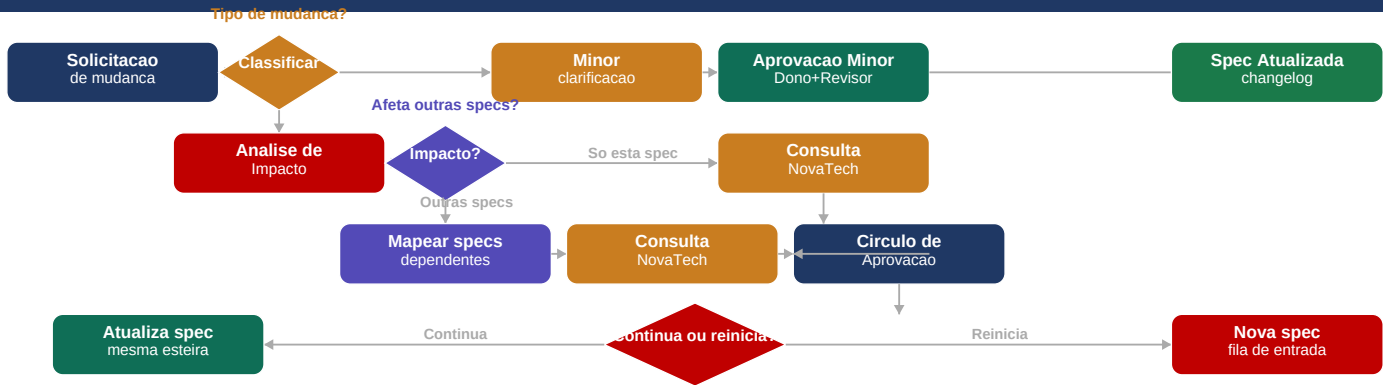

2. CRITERIOS PARA CONTINUAR NA SPEC OU REINICIAR NA ESTEIRA

Esta e a decisao central do processo de change management. O DM decide com base nos criterios abaixo, apos receber o parecer do TL e do PS.

Criterio	Continua na mesma spec	Reinicia na esteira (nova spec)
Volume de mudanca	Ate 30% das tasks afetadas	Mais de 30% das tasks afetadas ou requirements.md precisaria de revisao total
Tipo de mudanca	Clarificacao, ajuste de criterio de aceite, correcao de ambiguidade	Novo outcome, remocao de funcionalidade contratada, mudanca de arquitetura do modulo
Impacto em outras specs	Nenhuma outra spec afetada ou impacto Baixo em ate 1 spec	Impacto Alto em outra spec ou impacto em 2 ou mais specs simultaneamente
Impacto em prazo	Acrescimo de ate 3 dias uteis absorvivel no sprint	Acrescimo acima de 3 dias uteis ou que afeta a data de entrega do projeto
Tasks ja concluidas	Nenhuma task concluida e incompativel com a mudanca	1 ou mais tasks concluidas precisariam ser desfeitas ou refeitas do zero
Posicao na esteira	Spec em Em Implementacao: pode absorver via change request	Spec ja em Validada ou Implantada: mudanca estrutural exige nova spec na fila

Gestao de Mudanca de Spec — SDD

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

3. ANALISE DE IMPACTO — 6 DIMENSOES OBRIGATORIAS

Toda mudanca Major deve ser analisada nestas 6 dimensoes antes de qualquer aprovacao. O TL preenche escopo, prazo, outras specs e qualidade. O DM preenche custo e comunicacao.

Escopo	Pergunta central: O que muda no que sera entregue? Como analisar: Qual era o escopo original? O que esta sendo adicionado, removido ou alterado? Entregavel: Novos ou alterados: listar por ID (ex: QUERY-T003). Cancelados: listar com justificativa. Atencao: Requer novo plan.md? Requer nova versao major do requirements.md?
Prazo	Pergunta central: Quanto tempo adicional sera necessario? Como analisar: Quantas tasks serao afetadas? Qual o esforco estimado (P/M/G por task)? Entregavel: Novo prazo estimado para o modulo. Impacto na data de entrega geral do projeto. Atencao: O DM comunica a NovaTech qualquer impacto em prazo contratado antes de aprovar.
Custo	Pergunta central: Ha impacto financeiro para a DB1 ou para a NovaTech? Como analisar: Esforco adicional em horas. Necessidade de recursos nao previstos. Entregavel: Dentro da margem contratual: absorver. Acima da margem: negociar aditivo. Atencao: DM e responsavel pela analise de custo. Aprovacao do gerente comercial se acima da margem.
Outras Specs	Pergunta central: Quais outras specs sao afetadas? Como analisar: Verificar matriz de dependencias. Quais modulos dependem da spec que esta mudando? Entregavel: Listar specs afetadas + responsavel de cada + impacto estimado (Alto/Medio/Baixo). Atencao: TL avalia todas as dependencias antes de emitir parecer. Specs afetadas tambem precisam de CR.
Qualidade / Testes	Pergunta central: Os testes existentes ainda sao validos? Como analisar: Quais casos de teste do golden dataset sao impactados? Entregavel: Atualizar test-plan.md e golden dataset antes de reabrir a implementacao. Atencao: QA valida que todos os cenarios criticos continuam cobertos apos a mudanca.
Comunicacao	Pergunta central: Quem precisa ser informado? Como analisar: Time interno: todos os membros afetados pela mudanca. Cliente: NovaTech se impacto em escopo/prazo. Entregavel: DM responsavel pela comunicacao ao cliente. Usar e-mail formal com evidencias do impacto. Atencao: Nenhuma mudanca de escopo e comunicada ao time antes de aprovada pelo circulo completo.

Gestao de Mudanca de Spec — SDD

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

4. MATRIZ DE DEPENDENCIAS ENTRE SPECS — NOVATECH

Antes de aprovar qualquer mudanca, o TL verifica esta matriz para identificar specs dependentes. Qualquer spec com impacto Alto ou Medio precisa de avaliacao propria.

Spec alterada	Spec dependente	Impacto	Como afeta
pipeline-ingestao	query-endpoint	Alto	Pipeline precisa estar populado antes de qualquer query. Mudanca em chunking ou schema de indexacao afeta diretamente o retrieval.
pipeline-ingestao	feedback-api	Medio	Feedback referencia source_document que vem do pipeline. Mudanca no identificador de fonte afeta o feedback.
query-endpoint	teams-bot	Alto	Bot consome o query endpoint. Qualquer mudanca na API (contrato de request/response) quebra a integracao do bot.
query-endpoint	painel-web	Alto	Painel exhibe historico de queries. Mudanca no schema de resposta afeta a exibicao dos dados.
feedback-api	painel-web	Medio	Painel exhibe metricas de feedback. Mudanca nos campos de feedback afeta os graficos do dashboard.
teams-bot	painel-web	Baixo	Painel pode exhibir sessoes do bot. Impacto apenas se mudar identificacao de sessao.

5. INFORMACOES NECESSARIAS DO CLIENTE — O QUE PEDIR A NOVATECH

A analise de impacto so e completa quando o cliente forneceu todas as informacoes abaixo. O DM e responsavel por coletar esse insumo antes de iniciar o circulo de aprovacao.

Informacao necessaria	O que pedir e por que	Impacto se ausente
Descricao da necessidade	O que o cliente precisa que mudou? Qual o gatilho da mudanca (novo processo interno, feedback de atendente, erro identificado, mudanca regulatoria)?	Sem contexto claro, o time nao consegue avaliar se a mudanca e realmente necessaria ou se pode ser resolvida de outra forma.
Impacto operacional esperado	Se a mudanca NAO for feita, o que acontece? Qual o impacto para os atendentes ou para o negocio?	Ajuda a priorizar: mudancas com impacto alto no atendimento diario tem prioridade sobre melhorias esteticas.
Exemplos concretos	Exemplos reais de chamados onde o comportamento atual nao atende. Prints, logs, casos especificos de atendimento.	Evidencias concretas eliminam ambiguidade e aceleram a analise de impacto pelo TL e pelo PS.
Urgencia e prazo esperado	Qual a urgencia da mudanca? Ha algum deadline operacional ou regulatorio que precisa ser respeitado?	O DM precisa dessa informacao para decidir se a mudanca entra no sprint atual ou no proximo.

Restricoes conhecidas	Ha restricoes que o cliente ja conhece? Sistemas legados, integradores externos, restricoes de Compliance?	Restricoes nao comunicadas descobertas durante a implementacao geram retrabalho e atraso.
Tomador de decisao confirmado	Quem na NovaTech tem autoridade para aprovar o impacto em prazo e custo? Confirmar nome e papel antes de iniciar a analise.	Sem tomador de decisao confirmado, o circulo de aprovacao pode ficar parado esperando validacao interna do cliente.

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

A aprovacao segue uma sequencia obrigatoria. Nenhuma etapa pode ser pulada mesmo que os aprovadores estejam disponiveis simultaneamente. A ordem importa: o DM so decide apos ter os pareceres do PS e do TL.

#	Papel	Responsabilidade	Prazo
1	Solicitante	Abre o CR com motivacao e descricao. Disponivel para responder duvidas.	—
2	Product Specialist	Valida sentido de negocio, outcomes e criterios de aceite.	4h uteis
3	Tech Lead	Emite parecer tecnico: tasks, esforco, specs dependentes.	8h uteis
4	NovaTech	Confirma necessidade, fornece contexto e aceita impacto em prazo.	48h uteis
5	Delivery Manager	Decisao final: continua, reinicia ou reprova. Registra em ADR.	24h uteis (apos NT)

Toda mudança Major usa este template. O arquivo é criado em `/docs/change-requests/CR-{NNNN}.md` e referenciado no PR da spec alterada. CRs aprovados que alteram decisões de arquitetura também geram um ADR em `/docs/adr/`.

```
## CHANGE REQUEST -- [modulo/artefato] v{nova versao}

ID: CR-{NNNN} Data: YYYY-MM-DD

Solicitante: [nome e papel] Sprint atual: Sprint {N}

Spec afetada: /specs/{modulo}/requirements.md (ou plan.md / tasks.md)

Status atual da spec: Em Implementacao

=====

SECAO 1 -- DESCRICAO DA MUDANCA

=====

O que muda: [descricao objetiva e concisa]

O que NAO muda: [deixar explicito para evitar escopo adicional]

Motivacao: [por que e necessario? qual o risco de nao fazer?]

Tipo: [ ] Minor (clarificacao) [ ] Major (escopo/arquitetura)

=====

SECAO 2 -- ANALISE DE IMPACTO (preenchida pelo TL)

=====

Tasks bloqueadas: [IDs ex: QUERY-T003, QUERY-T005]

Tasks a criar: [estimativa ex: 2 novas tasks, tamanho M]

Tasks nao afetadas: [IDs confirmados pelo TL]

Tasks ja concluidas impactadas: [IDs + se precisam ser refeitas]

Outras specs afetadas:
```

- [spec]: [impacto Alto/Medio/Baixo] – [descricao]

- [spec]: [impacto Alto/Medio/Baixo] – [descricao]

Impacto em prazo: +{N} dias uteis

Nova data estimada: {data}

Decisao TL: ☐ Continua na spec ☐ Reinicia na esteira

SECAO 3 – INFORMACOES DO CLIENTE (preenchidas com NovaTech)

Necessidade confirmada por: [nome + cargo na NovaTech]

Exemplos concretos: [chamados, prints, casos reais]

Urgencia declarada: ☐ Critica ☐ Alta ☐ Normal

Impacto se nao feito: [descricao]

Tomador de decisao (prazo): [nome + cargo]

SECAO 4 – CIRCULO DE APROVACAO

☐ Product Specialist: _____ Data: _____ Parecer: Aprovado / Reprovado

☐ Tech Lead: _____ Data: _____ Parecer: Aprovado / Reprovado

☐ Delivery Manager: _____ Data: _____ Parecer: Aprovado / Reprovado

☐ NovaTech (cliente): _____ Data: _____ Parecer: Aprovado / Reprovado

Resultado final: ☐ Aprovado – continua na spec ☐ Aprovado – reinicia ☐ Reprovado

Decisao registrada em: /docs/adr/ como ADR-{NNNN}-change-{modulo}.md
