


Plano de Discovery — AI First

Projeto NovaTech × DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

VISAO GERAL DO DISCOVERY — 2 SEMANAS



CRONOGRAMA VISUAL — 10 DIAS UTEIS

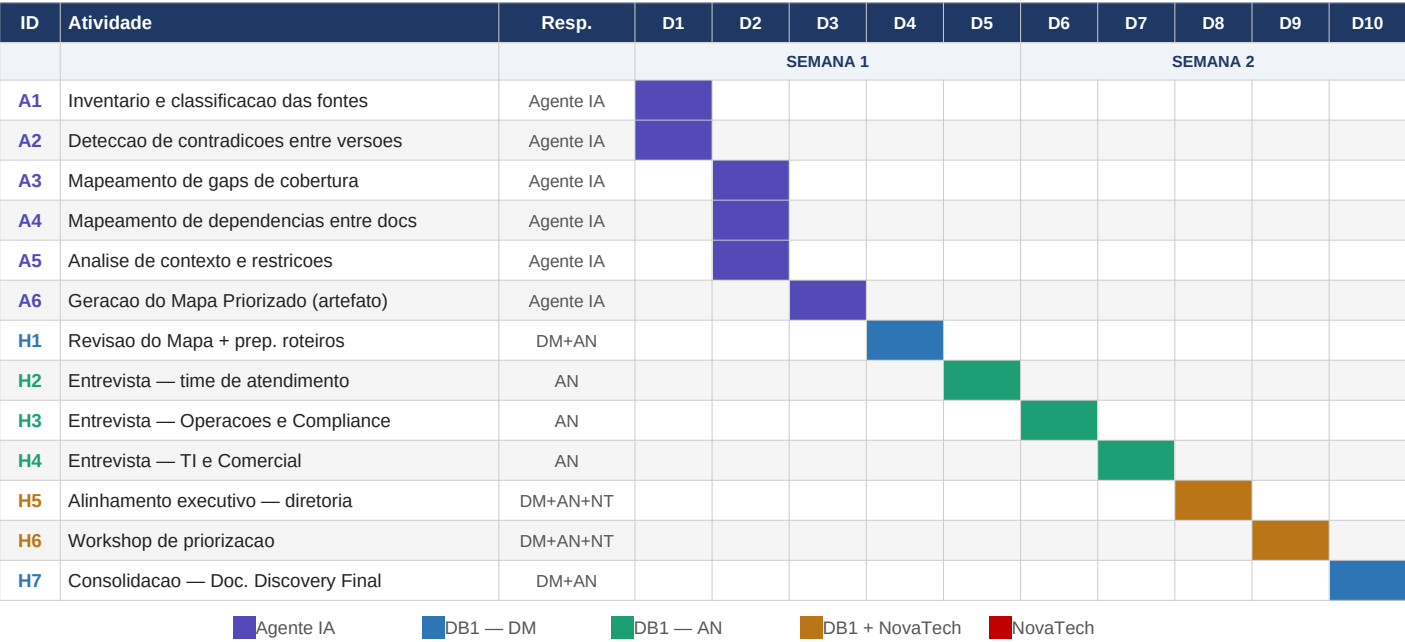

Plano de Discovery — AI First

Projeto NovaTech × DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

FASE DE INTENT — ATIVIDADES DOS AGENTES DE IA (DIAS 1 A 3)

A1 Inventario e classificacao das fontes documentais			Duracao: 4h
O agente varre todas as ~1.250 fontes disponiveis (SharePoint, Confluence, pasta de rede) e classifica cada documento por tipo (normativo, contratual, informal, operacional), responsavel, data de atualizacao e status de vigencia. Gera matriz de inventario completa que serve de base para todas as analises subseqüentes. Tempo equivalente humano: 3-5 dias.			
DB1 — Responsavel: Agente IA (supervisionado pelo DM)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: Acesso concedido as 3 fontes documentais	
Entradas: Acesso ao SharePoint, Confluence e pasta de rede compartilhada	Saidas / Entregavel: Matriz de inventario: ~1.250 documentos classificados por tipo, responsavel e vigencia	NovaTech fornece: Acesso de leitura ao SharePoint corporativo, Confluence e pasta de rede. Credenciais ou token de API fornecidos antes do Dia 1.	
A2 Deteccao de contradicoes e conflitos entre versoes			Duracao: 4h
O agente compara documentos com sobreposicao de escopo — com ênfase especial na PROC-042 v1 vs v2 já identificada na análise inicial — e sinaliza divergências com evidência textual: qual campo diverge, qual o valor em cada versão, qual documento tem data mais recente. Entrega relatório de conflitos priorizados por impacto operacional.			
DB1 — Responsavel: Agente IA (supervisionado pelo DM)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: A1 concluida	
Entradas: Matriz de inventario (A1). Documentos com sobreposicao de escopo identificados.	Saidas / Entregavel: Relatorio de contradicoes: campo divergente, valor por versao, documento mais recente, impacto estimado	NovaTech fornece: Nenhum insumo adicional necessario nessa etapa.	
A3 Mapeamento de gaps de cobertura documental			Duracao: 3h
O agente cruza os tópicos frequentes de atendimento (extraídos do FAQ e de perguntas-tipo disponíveis) com os documentos disponíveis, identificando temas sem cobertura formal. Exemplos já conhecidos: frete padrão abaixo de 500kg, política de carga danificada em trânsito, seguro de carga. Entrega lista priorizada de gaps com nível de criticidade.			
DB1 — Responsavel: Agente IA (supervisionado pelo DM)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: A1 concluida	
Entradas: Matriz de inventario (A1). FAQ-Atendimento. Lista de topicos de chamados frequentes.	Saidas / Entregavel: Lista de gaps: topico, criticidade (alta/media/baixa), frequencia estimada, documento mais proximo disponivel	NovaTech fornece: Historico de chamados dos ultimos 3-6 meses (anonimizado). Lista das 20-30 perguntas mais frequentes do time de atendimento.	
A4 Mapeamento de dependencias entre documentos			Duracao: 2h
O agente identifica referências cruzadas entre documentos (ex: POL-001 referencia PROC-088 para cargas em trânsito; PROC-042 referencia PROC-043 para cargas perigosas pesadas). Gera grafo de dependências indicando quais documentos ausentes bloqueiam cobertura completa de um tópico.			
DB1 — Responsavel: Agente IA (supervisionado pelo DM)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: A1 e A3 concluidas	
Entradas: Matriz de inventario (A1). Lista de gaps (A3).	Saidas / Entregavel: Grafo de dependencias: documento > referencia > documento referenciado (presente ou ausente)	NovaTech fornece: Nenhum insumo adicional necessario nessa etapa.	
A5 Analise de contexto de negocio e restricoes			Duracao: 2h
O agente analisa o contexto operacional da NovaTech: volume de chamados, tiers de clientes (Gold/Silver/Standard), SLAs por categoria, cadências de atualização de cada fonte, responsáveis formais e informais, e restrições de acesso por área. Identifica riscos de governança documental.			
DB1 — Responsavel: Agente IA (supervisionado pelo DM)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: A1 concluida	
Entradas: Matriz de inventario (A1). SLA-2024. POL-001. Metadados das fontes.	Saidas / Entregavel: Relatorio de contexto: restricoes de acesso, riscos de governanca, responsaveis por fonte, cadencias de atualizacao	NovaTech fornece: Nenhum insumo adicional — baseado nos documentos ja fornecidos.	
A6 Geracao do Mapa Priorizado — Artefato Central do Discovery			Duracao: 4h

Com base em A1 a A5, o agente consolida e entrega o artefato central da fase de Intent: mapa estruturado com fontes ranqueadas por relevância para o atendimento, dependências mapeadas, gaps priorizados por criticidade e contradições sinalizadas com evidência. Este é o documento que o Analista de Negócios leva para todas as entrevistas.

DB1 — Responsavel: Agente IA + DM (validacao antes de distribuir)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: A1, A2, A3, A4 e A5 concluidas
Entradas: Todos os outputs de A1 a A5	Saidas / Entregavel: Mapa Priorizado: fontes ranqueadas, dependencias, gaps com criticidade, contradicoes com evidencia. Formato: documento estruturado revisado pelo DM.	NovaTech fornece: Nenhum insumo adicional necessario nessa etapa.

Plano de Discovery — AI First

Projeto NovaTech × DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

DISCOVERY HUMANO — ATIVIDADES DO ANALISTA DE NEGOCIOS E DM (DIAS 4 A 10)

H1 Revisao do Mapa Priorizado e preparacao dos roteiros de entrevista

Duracao: 4h (Dia 4)

DM e Analista de Negócios revisam internamente o Mapa Priorizado gerado pelo agente. Validam se os gaps e contradições fazem sentido no contexto do negócio. Ajustam prioridades e preparam roteiros de entrevista específicos para cada stakeholder (atendentes, Operações/Compliance, TI/Comercial, Diretoria).

DB1 — Responsavel: DM (gestao e aprovacao) + Analista de Negocios (execucao)	NovaTech — Responsavel: Nao aplicavel	Depende de: A6 concluida e validada pelo DM
Entradas: Mapa Priorizado (A6). Contexto do projeto. Lista de stakeholders NovaTech.	Saidas / Entregavel: Mapa validado internamente. 4 roteiros de entrevista (um por stakeholder). Agenda de reunioes acordada com NovaTech.	NovaTech fornece: Lista de stakeholders disponiveis por area (nome, cargo, area). Confirmacao de disponibilidade para Dias 5, 6, 7 e 8.

H2 Entrevista — Time de atendimento (usuarios diretos do assistente)

Duracao: 90min (Dia 5)

O Analista de Negócios conduz sessão com 4-6 atendentes representativos para validar os gaps identificados pelo agente, entender os casos de uso mais críticos no dia a dia e mapear comportamentos reais de busca: o que procuram, onde procuram, onde travam. O DM acompanha como observador e garante que os objetivos da sessão sejam atingidos.

DB1 — Responsavel: Analista de Negocios (facilitador) + DM (observador e garantia)	NovaTech — Responsavel: 4 a 6 atendentes representativos indicados pelo gestor de atendimento	Depende de: H1 concluida. Agenda confirmada com NovaTech.
Entradas: Roteiro de entrevista (H1). Mapa Priorizado (A6). Lista de gaps e perguntas sem cobertura.	Saidas / Entregavel: Registro de casos de uso reais. Confirmacao ou ajuste dos gaps. Lista de perguntas frequentes nao cobertas. Priorizacao inicial pelos proprios usuarios.	NovaTech fornece: 4 a 6 atendentes disponibilizados por 90 minutos. Sala ou link de videoconferencia. Acesso ao sistema de chamados para exemplificar casos reais durante a sessao.

H3 Entrevista — Operacoes e Compliance (donos da documentacao normativa)

Duracao: 60min (Dia 6)

O Analista de Negócios conduz sessão com os responsáveis pela documentação normativa para entender o processo de criação e atualização de documentos, validar quem tem autoridade para resolver contradições (ex: PROC-042 v1 vs v2), definir o processo de curadoria contínua e identificar documentos em elaboração que devem ser aguardados antes da ingestão.

DB1 — Responsavel: Analista de Negocios (facilitador) + DM (garantia de decisoes criticas)	NovaTech — Responsavel: Responsavel de Operacoes + Responsavel de Compliance	Depende de: H1 concluida. Relatorio de contradicoes (A2) disponivel.
Entradas: Relatorio de contradicoes (A2). Roteiro de entrevista (H1). Mapa Priorizado (A6).	Saidas / Entregavel: Decisao sobre versao vigente dos documentos conflitantes. Responsaveis formais por curadoria. Cadencia de atualizacao formal acordada. Lista de documentos em elaboracao.	NovaTech fornece: Responsavel de Operacoes disponivel por 60 minutos. Responsavel de Compliance disponivel por 60 minutos. Acesso para confirmar versao vigente dos documentos conflitantes identificados.

H4 Entrevista — TI e Comercial (donos das fontes secundarias)

Duracao: 60min (Dia 7)

O Analista de Negócios conduz sessão para entender a estrutura das fontes Confluence e planilhas XLSX: como estão organizadas, quem atualiza, quais têm estrutura complexa (abas múltiplas, fórmulas, células mescladas), e se há restrições de acesso por área ou perfil de usuário.

DB1 — Responsavel: Analista de Negocios (facilitador) + Tech Lead DB1 (questoes tecnicas de ingestao)	NovaTech — Responsavel: Responsavel de TI + Responsavel Comercial	Depende de: H1 concluida. Inventario de fontes (A1) e grafo de dependencias (A4) disponiveis.
Entradas: Inventario de fontes (A1). Grafo de dependencias (A4). Roteiro tecnico de entrevista (H1).	Saidas / Entregavel: Mapa de acesso as fontes por perfil. Identificacao de planilhas problematicas para ingestao. Validacao de cadencias de atualizacao. Restricoes de acesso por area.	NovaTech fornece: Responsavel de TI disponivel por 60 minutos. Responsavel Comercial disponivel por 60 minutos. Acesso demonstrativo ao Confluence e a pasta de rede para mapeamento ao vivo.

H5 Alinhamento executivo — Diretoria NovaTech

Duracao: 45min (Dia 8)

O DM e o Analista de Negócios apresentam para o Diretor (e se possível o CEO) os gaps críticos identificados, as contradições documentais que precisam de decisão e as prioridades de negócio para os 3 meses. Esta sessão consolida o alinhamento de expectativas iniciado pelo e-mail enviado anteriormente e garante que o escopo do assistente reflita as prioridades reais da liderança.

DB1 — Responsavel: DM (lideranca da sessao) + Analista de Negocios (apresentacao tecnica)	NovaTech — Responsavel: Diretor NovaTech (obrigatorio) + CEO (se disponivel)	Depende de: H2, H3 e H4 concluidas. Mapa atualizado com insumos das entrevistas.
Entradas: Mapa Priorizado atualizado. One-pager do assistente (já entregue por e-mail). Critérios de sucesso acordados. Resumo dos gaps criticos.	Saidas / Entregavel: Prioridades de negocio validadas. Decisao sobre gaps que precisam de documentacao nova antes do go-live. Aprovacao do escopo da primeira versao. Responsaveis NovaTech por producao de documentacao faltante.	NovaTech fornece: Diretor disponivel por 45 minutos. CEO disponivel por 45 minutos (se possivel). Autonomia para decidir sobre prioridades de escopo e comprometer areas internas na producao de documentos faltantes.

H6

Workshop de priorizacao — DB1 + NovaTech

Duracao: 2h (Dia 9)

Sessão colaborativa para priorizar quais fontes entram na primeira versão do assistente, quais gaps serão endereçados com documentação nova (e quem produz), quais contradições precisam de resolução antes da ingestão e quais ficam para fase 2. O Analista de Negócios facilita. O DM garante que as decisões sejam registradas e acionáveis.

DB1 — Responsavel: DM (gestao e registro de decisoes) + Analista de Negocios (facilitacao)	NovaTech — Responsavel: Representantes de Operacoes, TI e Comercial. Idealmente o mesmo grupo das entrevistas H3 e H4.	Depende de: H5 concluida e prioridades executivas validadas.
Entradas: Mapa Priorizado atualizado. Outputs de H2, H3, H4, H5. Lista de gaps e contradicoes.	Saidas / Entregavel: Backlog priorizado de fontes para ingestao. Lista de documentos a criar ou corrigir com responsaveis e prazos. Decisao sobre PROC-042 v1 vs v2 e outros conflitos. Escopo final da primeira versao do assistente.	NovaTech fornece: 3 a 4 representantes das areas (Operacoes, TI, Comercial) disponíveis por 2 horas. Sala fisica ou virtual com capacidade para trabalho colaborativo. Autonomia para comprometer prazos de entrega de documentos faltantes.

H7

Consolidacao — Documento de Discovery Final e Backlog Inicial

Duracao: 1 dia (Dia 10)

O DM e o Analista de Negócios consolidam todos os insumos das entrevistas e do workshop em um Documento de Discovery Final: escopo validado, fontes priorizadas para ingestão, gaps mapeados com responsáveis, decisões tomadas e premissas formalmente registradas. Este documento é a base para o planejamento de sprints do projeto.

DB1 — Responsavel: DM (revisao e aprovacao) + Analista de Negocios (producao do documento)	NovaTech — Responsavel: Validacao pelo Diretor NovaTech (assinatura ou aprovacao formal)	Depende de: H6 concluida. Todas as decisoes registradas.
Entradas: Outputs de H1 a H6. Mapa Priorizado final. Decisoes do workshop.	Saidas / Entregavel: Documento de Discovery Final. Backlog inicial de sprints. Premissas registradas. Responsabilidades NovaTech formalizadas.	NovaTech fornece: Disponibilidade do Diretor para revisao e aprovacao formal do documento em ate 24h apos entrega.

Plano de Discovery — AI First

Projeto NovaTech × DB1 Global Software | Junho 2026 | Confidencial

O QUE A NOVATECH PRECISA FORNECER — REQUISITOS POR ATIVIDADE

Quando	O que	Descrição / Impacto se ausente	Quem (NT)
Antes do Dia 1 (Pre-requisito)	Acessos técnicos	Credenciais ou tokens de API para acesso de leitura ao SharePoint corporativo, Confluence e pasta de rede compartilhada. Sem esse acesso os agentes de IA não podem iniciar a fase de Intent.	TI / Diretor
Antes do Dia 5 (Para H1-H4)	Pessoas disponibilizadas	4-6 atendentes representativos (H2). Responsável de Operações + Responsável de Compliance (H3). Responsável de TI + Responsável Comercial (H4). Confirmação de agenda para os Dias 5, 6 e 7.	Gestores de cada área
Antes do Dia 8 (Para H5)	Disponibilidade executiva	Diretor NovaTech por 45 minutos no Dia 8. CEO se possível. Autonomia para decidir sobre prioridades de escopo e comprometer áreas internas.	Diretor / CEO
Antes do Dia 9 (Para H6)	Workshop — equipe e espaço	3-4 representantes das áreas (Operações, TI, Comercial) por 2 horas no Dia 9. Sala física ou virtual com suporte a trabalho colaborativo (whiteboard, votação). Autonomia para comprometer prazos de entrega de documentos faltantes.	Diretor / Gestores
Histórico de chamados (Para A3)	Dados operacionais	Histórico de chamados dos últimos 3-6 meses (pode ser anonimizado). Lista das 20-30 perguntas mais frequentes do time de atendimento. Usado pelo agente para mapear gaps de cobertura com base em demanda real.	Gestão de Atendimento
Após Dia 10 (Para encerramento)	Aprovação formal do Discovery	Disponibilidade do Diretor para revisão e aprovação formal do Documento de Discovery Final em até 24h após entrega. Aprovação libera início do planejamento de sprints do projeto.	Diretor NovaTech

PAPEIS E RESPONSABILIDADES — RESUMO

Papel	Pessoa / Entidade	Responsabilidade no Discovery
DM	Felipe (DB1)	Gestão geral do Discovery. Garante que todas as atividades aconteçam no prazo. Valida artefatos críticos (Mapa Priorizado, Roteiros, etc.).
Analista de Negócios	AN (DB1)	Execução das atividades humanas: conduz entrevistas H2, H3, H4, facilita workshop H6, produz roteiros (H1) e Documentos de Referência (H5).
Tech Lead	TL (DB1)	Participa da entrevista H4 (questões técnicas de ingestão de XLSX e Confluence). Valida viabilidade técnica das decisões.
Agente de IA	IA (supervisionado pelo DM)	Executa integralmente a fase de Intent (A1 a A6). Processa ~1.250 fontes e entrega Mapa Priorizado em 1-2 dias.
Diretor NovaTech	Diretor (cliente)	Disponibiliza stakeholders para entrevistas. Participa do alinhamento executivo H5. Aprova escopo no workshop H6.
Stakeholders NovaTech	Atendentes, Ops, Compliance, TI, Comercial	Participam das entrevistas H2, H3, H4 e do workshop H6. Fornecem contexto operacional e validam gaps identificados.
